

AA3 - staatus 2021

Marek Zacek

Eesmärgid 2021 vs RES

- Riigi Tugiteenuste Keskus - automaatne andmevahetus alates 01.01.2022
- 50 AA3 andmevahetuse klienti läbi ERP-ide
- AA3 taksonoomiad on välja töötatud

KRIITILINE! Palgataksoneomia statistika tootmisliini FOR-ini rakendamine SA-s

Seoses 29.04.21 valitsuse poolt kinnitatud riigi eelarvestrateegiaga (RES) aastateks 2022-2025 on alates 01.07.2021 AA3 projekt SA-s „külmutatud“ kuni võimalike eelarveliste vahendite tekkimiseni tulevikus. Alternatiivina fokuseeritakse admin. andmete kasutamisele.

KRIITILINE! AA3 eelarve 2021 = 0

RTK liidestamine üle x-tee (palgataksonoomia)

Vahendatavaid asutusi: 180

Rakenduse algus: **alates 2022**

- Alates sügis 2020 – RTK sisemine palgataksonoomia analüüs ja arendus
- Märts 2021 – RTK pre-analüüs ja hanke ettevalmistus üle x-tee liidestamiseks
- Aprill-Mai 2021 – RTK üle x-tee liidestamise arendus (hange)
- Juuni 2021 – RTK-poolne taksonoomia rakendusvalmidus üle x-tee
- *Oktoober-November 2021 – SA-poolne RTK andmehõive ja töötluse test (s.t. palgataksonoomia tootmisliini FOR-ini ja AA3-kanalipõhiste andmete statistikas kasutuselevõtu test suures ulatuses) – **plaanitud enne „külmutamist“***
- *Detsember 2021 – puhveraeg - RTK ja SA vaheline palgataksonoomia rakendusvalmidus üle x-tee alates 2022 – **plaanitud enne „külmutamist“***

ERP liidestamine üle x-tee (palgataksnoomia)

Planeeritud uute ERP-ide rakenduse algus: 1. poolaasta 2021 - *enne „külmutamist“*



Columbus®

BCS itera



- Veebruar 2020 – Scriining: palgataksnoomia rakendatud üle x-tee, pilootklient Ida-Viru Keskhaigla
- Jaanuar 2021 – Columbus: palgataksnoomia rakendusvalmidus üle x-tee, test üle x-tee on tehtud
- Juuni 2021 - BCS Itera: palgataksnoomia rakendusvalmidus üle x-tee
- **KRIITILINE!** Sisuliste ReturnErrorite rakendamine, et ERP-id saaksid palgataksnoomia rakenduse oma klientidele avada.

HUB-ide liidestamine üle x-tee (palgataksnoomia)

Planeeritud HUB-ide (s.h. ERP-ide) rakenduse algus: 1. poolaasta 2021 - *enne „külmutamist“*


tieto *EVRY*



Swedbank 

- Jaanuar-Märts 2021
 - Tieto Evry - MyCompanyData: palgataksnoomia rakendusvalmidus üle x-tee, test üle x-tee on tehtud
 - Account Studio: palgataksnoomia rakendusvalmidus üle MCD-hub'i
- Aprill 2021
 - Swedbank Gateway: palgataksnoomia rakendusvalmidus üle x-tee, test üle x-tee on tehtud
- **KRIITILINE!** Sisuliste ReturnErrorite rakendamine, et HUB-i kaudu ERP-id saaksid palgataksnoomia rakenduse oma klientidele avada.

Arendused: AA3 statistika tootmisliin (palgataksnoomia)

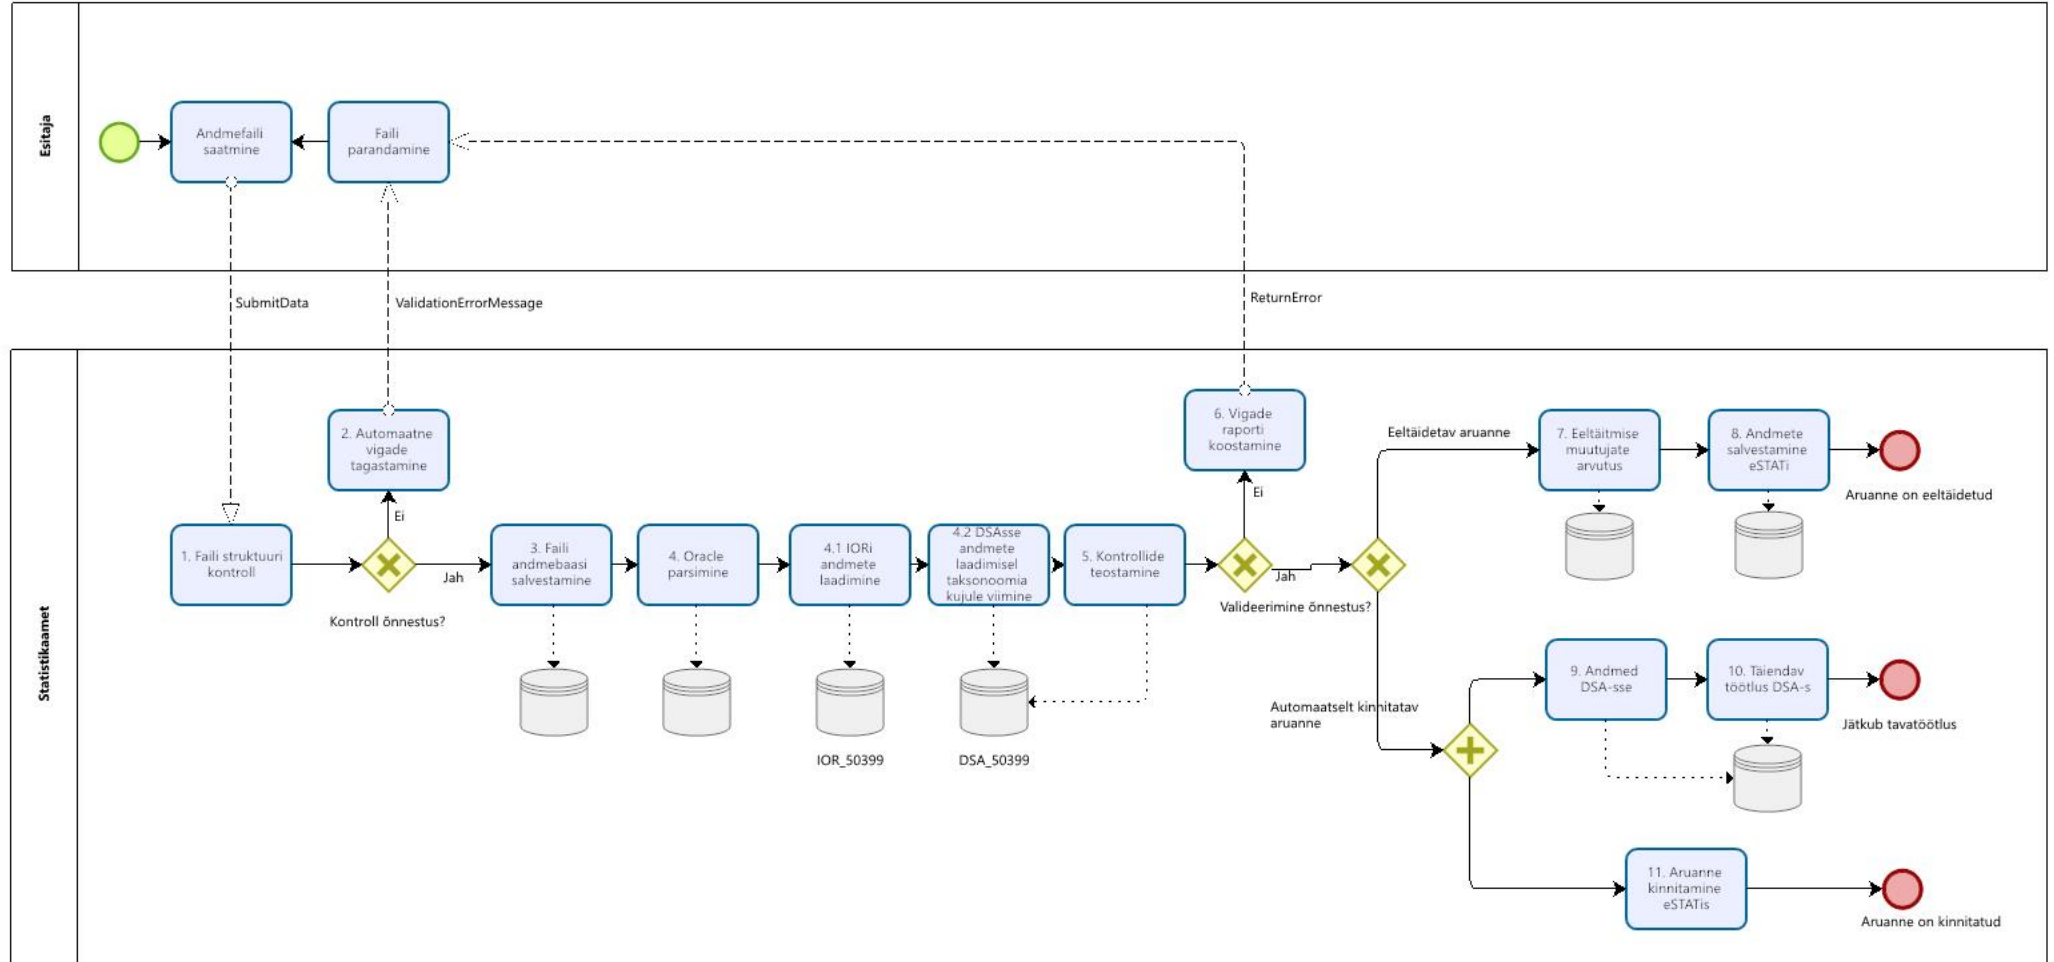


Andmehõive ja töötuse protsessiskeem

Andmehõive ja töötamise protsess: arendusfookus 2021*

1. Faili struktuuri kontroll	Andmehõive	x-gate
2. Automaatne vigade tagastamine	Andmehõive	x-gate
3. Faili andmebaasi salvestamine	Andmehõive	x-gate
4. Oracle parsimine	Andmehõive	Oracle
5. Kontrollide teostamine	Andmehõive + disain	Oracle
6. Vigade raporti koostamine	Andmehõive + disain	x-gate
7. Eeltäitmise muutujate arvestus	Andmehõive + disain	Oracle
8. Andmete salvestamine eStat-i	Andmehõive	Oracle
9. Andmed DSA-sse	Töötlus	Vais
10. Täiendav töötlus DSA-s	Töötlus + disain	Vais
11. Andmete kinnitamine eStat-is	Protsess väljatöötamisel	eStat

* enne „külmutamist“

Andmehõive ja töötluste arenduste tegevus- ja ajakava*

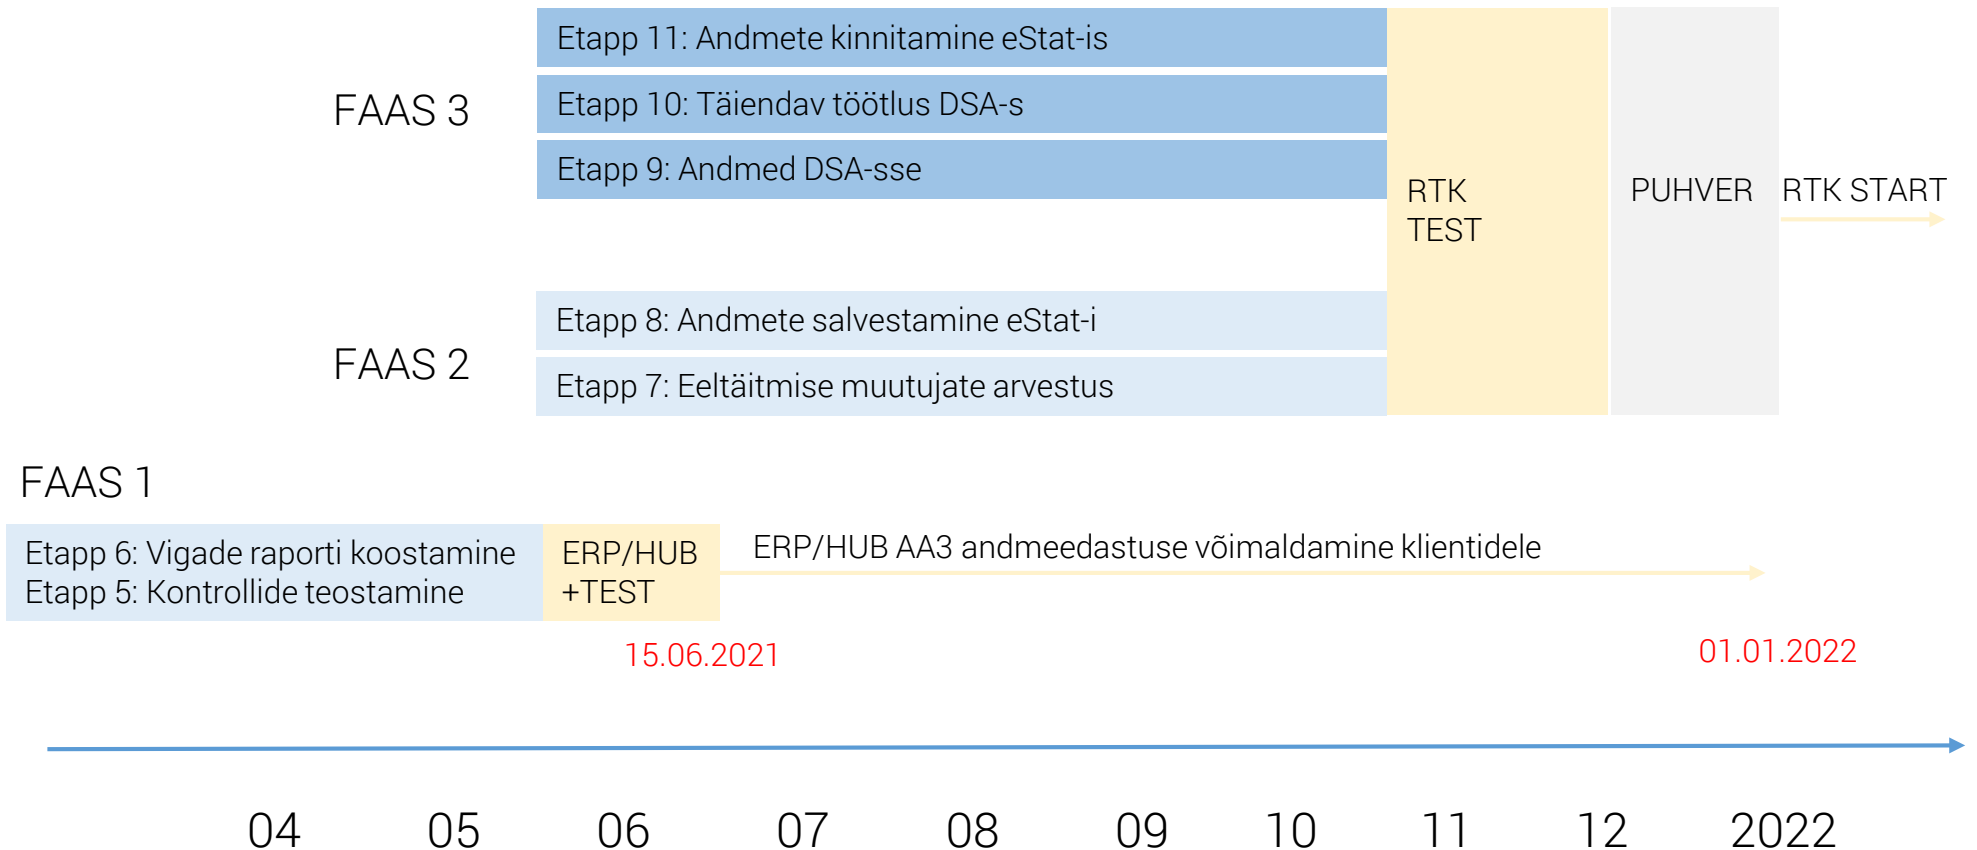

* enne „külmutamist“

Taksonoomia väljatöötamise ajakava*

- Etapp 1 - PALGA JA TÖÖJÕUKULUDE TAKSONOOMIA (MTA+SA), s.h. TSD Lisa 1-2 (MTA) 2018
- OSTU JA MÜÜGI TAKSONOOMIA (SA+MTA+EP+RTE): *KÜLMUTATUD! (RES)*
 - Etapp 2 - ETTEVÕTETE KUULISED KÜSIMUSTIKUD (SA):
 - Moodul: Väliskaubandus ja tööstus (integreeritud, s.h. kaubad ja teenused) 2020
 - Moodul: Jaekaubandus - KMD baasil *Q1/Q2 2021*
 - Etapp 3 – ETTEVÕTETE KVARTAALSED KÜSIMUSTIKUD (SA), s.h. KMD (MTA): *Q1/Q2 2021*
 - Moodul: Ettevõtete majandusnäitajad – KMD baasil
 - Etapp 4 - ETTEVÕTETE AASTASED KÜSIMUSTIKUD (SA): *Q2/Q3 2021*
 - Moodul: Ettevõtete majandusnäitajad
 - Etapp 5 - ETTEVÕTETE ERIKÜSIMUSTIKUD (SA):
 - Moodul: PM ja keskkond *Q2 2021*
 - Moodul: Transport *Q2 2021*
 - Moodul: Energia (s.h kütus) 2021 (RTE) - TÖÖS
- VARADE JA KOHUSTUSTE TAKSONOOMIA (SA), s.h. nt. TSD Lisa 7 (MTA) *Q2/Q3 2021*
- Küsimustik Majutus (SA) (automatiseeritakse SIM projekti raames) >2022 (EAS)

* enne „külmutamist“

Täna!
